



# 모니터 및 제어(MC)

## MC 개요

### 필수 PA 정보

#### 의향

성능이 계획에서 크게 벗어날 때 적절한 수정 작업을 수행할 수 있도록 프로젝트 진행 상황에 대한 이해를 제공합니다.

#### 값

상당한 성능 편차를 조정하기 위해 조기 조치를 취하여 목표를 달성할 확률을 높입니다.

### 추가 필수 PA 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

### 설명 PA 정보

#### 실습 요약

##### 레벨 1

эм씨 1.1      작업 완료를 기록합니다.

эм씨 1.2      문제를 식별하고

해결합니다.

##### 레벨 2

эм씨 2.1      규모, 작업량, 일정, 자원, 지식 및 기술, 예산에 대한 추정치와 비교하여 실제 결과를 추적합니다.

эм씨 2.2      식별된 이해 관계자 및 약속의 참여를 추적합니다. эм씨 2.3      운영 및 지원으로의 전환을 모니터링합니다.

эм씨 2.4      실제 결과가 계획된 결과와 크게 다를 경우 시정 조치를 취하고 종료할 수 있습니다.

##### 레벨 3

эм씨 3.1      프로젝트 계획 및 프로젝트 프로세스를 사용하여 프로젝트를 관리합니다. эм씨 3.2      중요한 종속성 및 활동을 관리합니다.

эм씨 3.3      작업 환경을 모니터링하여 문제를 식별합니다.

эм씨 3.4      영향을 받는 이해 관계자와 함께 문제를 관리하고 해결합니다.

## 추가 PA 설명 정보

"프로젝트 계획"이라는 용어는 프로젝트를 관리하기 위한 전반적인 계획을 나타내며 솔루션을 개발, 업데이트 또는 제공하기 위해 누가 언제 무엇을 하는지에 대한 일관된 설명을 포함합니다. 프로젝트 계획은 독립 실행형 문서일 수도 있고 여러 문서에 배포될 수도 있으며, 실제 진행 상황을 추적 및 전달하고 수정이 필요한지 여부를 결정하는 방법을 제공합니다.

진행 상황 추적은 일반적으로 다음에 대한 실제 값을 계획 또는 예상 값과 비교하는 것으로 구성됩니다.

- 크기
- 복잡성
- 노력
- 비용
- 일정
- 질
- 이정표
- 지식 및 기술
- 리소스
- 이해관계자 참여
- 약속
- 운영 및 지원으로의 전환

추정치에 대한 실제 데이터를 추적하면 고객 및 이해 관계자의 기대치를 관리하는 데 도움이 됩니다. 실제 값이 예상 값에서 크게 벗어날 경우 수정 조치를 취합니다. 이러한 수정 조치에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 과업 성취를 위한 전략 수정
- 목표 업데이트
- 계획 수정
- 추정치 수정
- 계약 및 약정의 수립 또는 수정
- 위험 및 기회 관리 활동과 작업 산출물 업데이트

프로젝트 계획에서 중요한 편차를 해결하기 위해 시정 조치가 필요한 경우 이러한 작업을 정의하고 추적하여 종료합니다.

## 관련 업무 영역

성능 및 측정(MPM) 관리 계획(PPLAN)


상황에 따라 다릅니다

애자일 개발

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 컨텍스트 태그: | 애자일 개발                       |
| 문맥:      | 애자일 기법 및 의식을 다른 프로세스와 통합합니다. |

[그림 MC-1: 애자일 개발 모니터링](#)에서 개발 흐름의 각 활동은 진행 상황을 모니터링할 수 있는 기회를 제공하고 회고 중에 검토됩니다. 예를 들어, 일일 스탠드업 중에 개인은 진행 상황과 방해 요소에 대해 보고하여 전반적인 상태 정보를 제공합니다. 스프린트 회고 동안 팀은 마지막 스프린트의 진행 상황을 검토하고 실제 속도와 계획된 속도를 고려하여 향후 스프린트 및 에픽을 조정합니다.

그림 MC-1: Agile 개발 모니터링

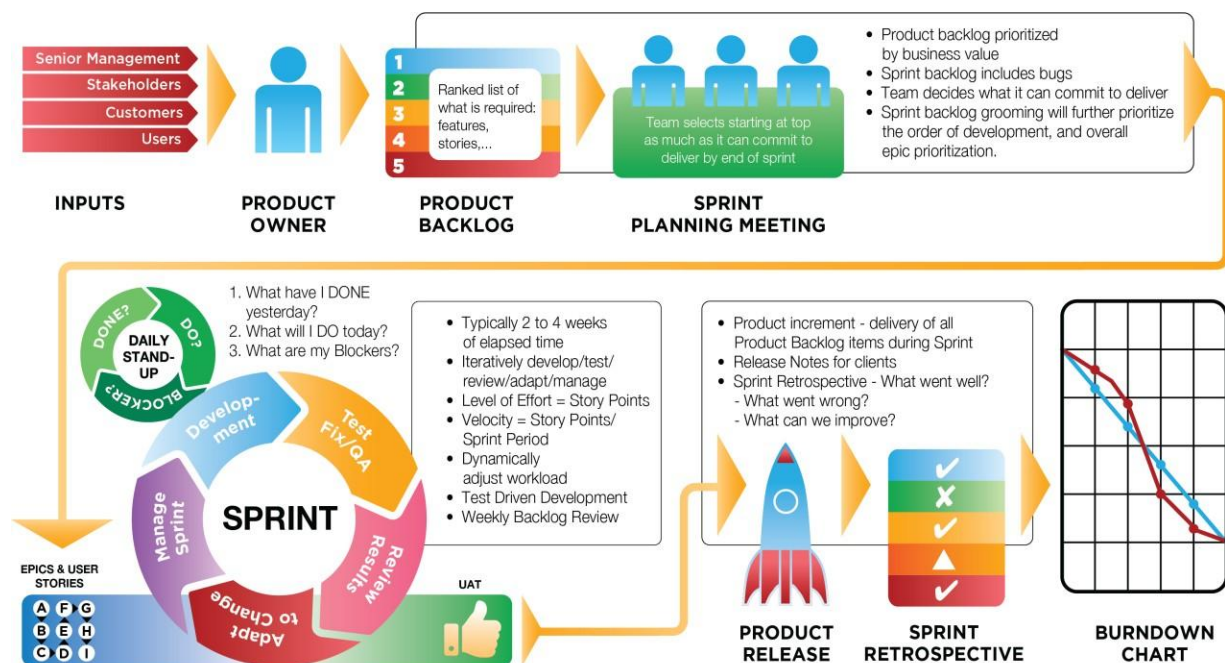


CMMI176V1 © 2021 ISACA

애자일 팀에 대한 일반적인 모니터링 관행(예: 스탠드업 회의, 시각적 정보 관리)은 다음을 사용하여 보고됩니다.

- 번다운 차트([그림 MC-2: 번다운 차트](#) 참조)는 각 스프린트 내에서 추적되고 일반적으로 여러 스프린트로 구성된 릴리스에 대한 모든 작업을 나타내는 남은 스토리 포인트의 수를 보여줍니다. 번다운 차트는 스프린트에 대해 커밋된 작업을 완료하는 데 필요한 시간을 나타내는 매일 업데이트됩니다.
- Kanban 보드 또는 기타 추적 도구의 시각적 정보는 팀 성과의 현재 상태와 성능 또는 진행에 영향을 줄 수 있는 관련 요소를 나타냅니다

그림 MC-2: 번다운 차트

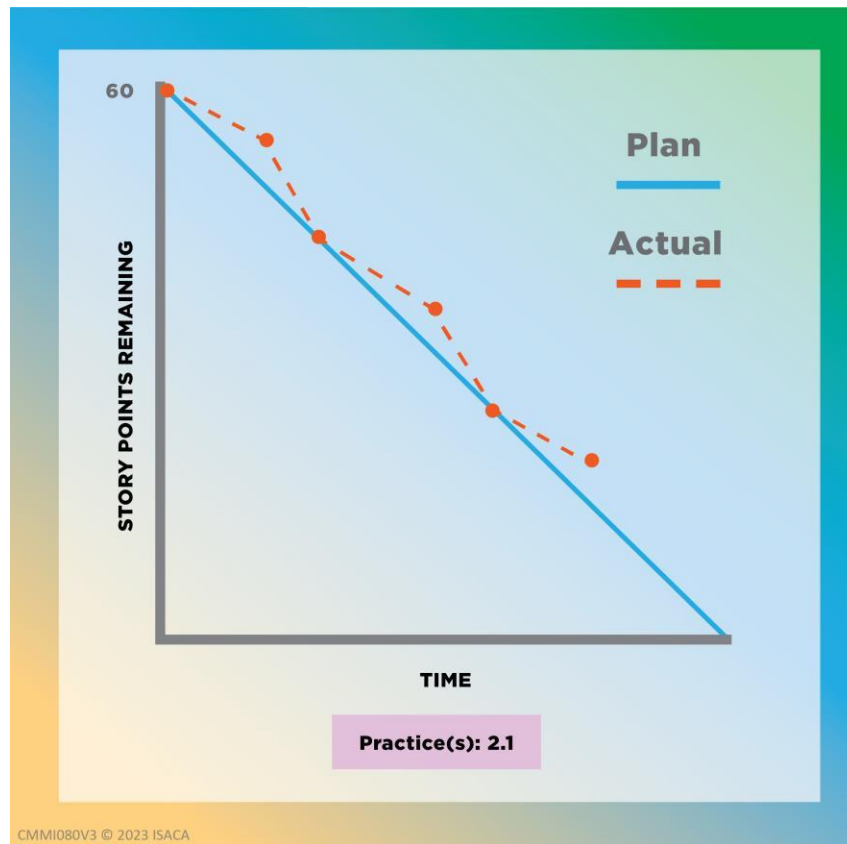

## 데이터

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 컨텍스트 태그: | CMMI 데이터                                       |
| 문맥:      | 프로세스를 사용하여 데이터 관리 모범 사례를 솔루션의 필수적인 부분으로 통합합니다. |

조직의 관련 요구 사항을 충족하기 위해 데이터를 관리하기 위한 접근 방식을 만드는 것은 일회성 작업이 아닙니다. 일단 개발되면 접근 방식의 실행과 변화하는 비즈니스 요구 사항을 면밀히 모니터링하고 정기적으로 평가하여 접근 방식이 품질에 대한 비즈니스 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다. 부족한 부분이 확인되거나 격차가 발견되면 접근 방식을 발전시켜야 하며, 여기에는 초점 변경 또는 진행 중인 프로젝트에 대한 조정이 포함될 수 있습니다.

## 데브섹옵스

|          |                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 컨텍스트 태그: | 데브섹옵스                                                                                                     |
| 문맥:      | DevSecOps는 보안 솔루션을 계획, 개발, 테스트, 배포, 릴리스 및 업데이트 유지하기 위해 개발, 운영 및 보안 간의 긴밀한 협력을 촉진하는 사고 방식, 문화 및 일련의 사례입니다. |

DevSecOps 팀은 자동화된 툴을 사용하여 DevSecOps 파이프라인을 모니터링하고, 애플리케이션 사용에 대한 주요 정보를 수집 및 평가하여 추세를 파악하고 문제 영역을 식별합니다. DevSecOps 팀은 인프라 리소스, 네트워크 전송, 애플리케이션 및 마이크로서비스, 컨테이너, 인터페이스 또는 연결, 게이트 체크 포인트, 엔드포인트 동작 및 보안 이벤트 로그를 모니터링하여 필요할 때 조치를 취합니다. 이 접근 방식을 통해 팀은 개발 초기 단계로 "이동"하고 손상된 생산 변경을 최소화할 수 있습니다.

#### 공급 업체

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 컨텍스트 태그: | CMMI-SPM                                   |
| 문맥:      | 프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다. |

프로젝트 초기에 모니터링 및 제어 기능을 개발하고, 공급업체 관리 전략을 정의할 때 계획하는 동안 수행합니다.

모니터링 및 통제 활동은 공급업체 관리 프로세스 전반에 걸쳐 다음을 보장하는 데 필수적입니다.

- 적절한 자원의 적용
- 인수자 활동은 계획에 따라 진행됩니다.

하나 이상의 공급업체를 선택하고 계약을 체결한 후에도 인수자는 자신의 활동과 작업 산출물을 계속 모니터링하고 통제합니다. 동시에 인수자는 공급업체의 진행 상황과 성과를 모니터링하고 제어하여 전반적인 노력에 미치는 영향을 확인합니다.

계약 요구 사항과 일치하는 공급업체 계약에서 공급업체 진행 상황 및 성과 보고 요구 사항을 정의합니다.

## 레벨 1

### 앰씨 1.1

#### 필수 실습 정보

##### 실천 선언문

작업 완료를 기록합니다.

##### 값

팀과 고위 경영진이 목표를 달성하기 위해 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 합니다.

#### 추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

#### 설명 실습 정보

##### 추가 설명 정보

완료된 작업 추적은 진행 상황 모니터링의 일부입니다. 작업을 정기적으로 검토하여 상태를 파악하며, 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 완료
- 지연
- 완료되지 않음

#### 예시 활동

| 예시 활동                                | 추가 설명                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작업 완료를 기록합니다.                        | 작업에 완료율이 부여될 수 있지만 이로 인해 "90% 완료, 90% 완료"와 같은 부정확한 상태 보고가 발생할 수 있습니다. 이를 방지하는 한 가지 방법은 100% 완료되거나 완료되지 않은 것으로 표시하는 것입니다. |
| 영향을 받는 이해관계자와 함께 업데이트된 작업 목록을 검토합니다. |                                                                                                                          |

#### 예시 작업 산출물

| 예시 작업 산출물 | 추가 설명                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 작업 목록     | 포함: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 묘사</li> <li>• 상태</li> <li>• 날짜</li> </ul> |

## 앰씨 1.2

### 필수 실습 정보

#### 실천 선언문

문제를 식별하고 해결합니다.

#### 값

통제되지 않은 비용 및 일정 변동을 방지할 수 있습니다.

### 추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

### 설명 실습 정보

#### 추가 설명 정보

문제가 발생할 때 이를 식별하고 해결합니다. 문제를 해결하는 것은 작업 일정을 유지하는 데 중요합니다. 식별된 문제를 분석하여 적절한 시정 조치를 결정하고 종료까지 추적합니다.

문제로 인해 계획되지 않은 작업이 발생할 수 있습니다. 문제를 모니터링하고 제어하지 않으면 이유를 이해하지 못한 채 작업이 지연될 수 있습니다.

#### 예시 활동

| 예시 활동                       | 추가 설명                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 문제 및 작업 항목 목록에 문제를 기록합니다.   |                                                                |
| 문제 또는 작업 항목을 해결할 책임을 할당합니다. | 사람들이 행동을 해결할 책임이 있다는 것을 인식하도록 합니다.                             |
| 두 개의 날짜에 할당합니다.             | 책임이 할당된 사람과 협력하여 문제 또는 작업을 완료할 수 있는 시기를 결정합니다.                 |
| 종결할 문제 및 작업 항목을 추적합니다.      | 종료까지 추적하는 것은 프로젝트 계획이 영향을 받을지 여부와 어떻게 영향을 받을지 파악하는 데 매우 중요합니다. |

#### 예시 작업 산출물

| 예시 작업 산출물      | 추가 설명                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문제점 및 작업 항목 목록 | 포함 사항: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문제 또는 작업 항목에 대한 설명</li> <li>• 문제 또는 작업 항목에 할당된 사용자</li> <li>• 마감일</li> <li>• 상태</li> </ul> |

## 레벨 2

### 앰씨 2.1

#### 필수 실습 정보

##### 실천 선언문

규모, 작업량, 일정, 자원, 지식 및 기술, 예산에 대한 추정치와 비교하여 실제 결과를 추적합니다.

##### 값

중요한 편차를 식별하여 보다 효과적인 시정 조치를 취할 수 있으며, 이를 통해 목표를 달성할 가능성을 높일 수 있습니다.

#### 추가 필수 정보

프로젝트 진행 상황 및 성과의 지표에는 다음을 포함할 수 있는 작업 제품 및 작업의 특성이 포함됩니다.

- 비용
- 예산
- 노력
- 일정
- 크기
- 복잡성
- 용량 및 가용성
- 기능
- 지식 및 기술
- 리소스
- 이해관계자 참여
- 약속
- 운영 및 지원으로의 전환

#### 설명 실습 정보

##### 추가 설명 정보

실제 결과와 추정치를 추적할 때 관련 컨텍스트 정보를 기록하여 측정 데이터가 나타내는 내용을 이해하는 데 도움이 됩니다.

모니터링 빈도는 다음에 따라 다릅니다.

- 수거 일정
- 작업의 속도와 기간
- 마일스톤에 동의함

## 예시 활동

| 예시 활동                             | 추가 설명                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계획 및 추정치에 대한 실제 결과를 추적합니다.        | <p>규모, 작업량, 일정, 리소스, 지식 및 기술, 예산을 추적합니다.</p> <p>실제 결과 추적은 일반적으로 다음을 통해 이루어집니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 진행 상황 보고</li> <li>• 상태 검토</li> <li>• 마일스톤 검토</li> </ul>                                |
| 리소스 용량 및 가용성을 모니터링합니다.            | <p>시정 조치를 처리하는 데 필요한 리소스를 식별합니다. 여기에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사람</li> <li>• 프로세스</li> <li>• 물리적 시설</li> <li>• 컴퓨터, 주변 장치 및 소프트웨어</li> <li>• 네트워크</li> <li>• 보안 환경</li> </ul> |
| 작업 그룹 구성원의 지식과 기술을 모니터링합니다.       | <p>여기에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 변화를 평가하기 위해 사람들의 지식과 기술을 주기적으로 측정합니다.</li> <li>• 획득한 실제 교육과 프로젝트 계획에 기록된 교육 비교</li> <li>• 프로젝트 계획 추정치와의 중요한 차이점 파악</li> </ul>                |
| 프로젝트 계획에서 식별된 항목에 대한 약정을 모니터링합니다. | <p>여기에는 다음이 포함됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 내부 및 외부 약속을 정기적으로 검토합니다.</li> <li>• 충족되지 않았거나 충족되지 않을 위험이 큰 약속을 식별합니다.</li> <li>• 요구 사항에 대한 가용성, 신뢰성 및 유지 관리성 모니터링</li> <li>• 검토 결과 기록</li> </ul>  |
| 계획된 값과 실제 값에서 상당한 차이를 기록합니다.      | <p>여기에는 다음이 포함됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "significant"가 의미하는 바에 대한 기준을 정의합니다. 계획된 값과 실제 값</li> <li>• 보다 효과적인 미래 계획을 위해 사용할 중요한 차이점을 기록해 둡니다.</li> </ul>                                     |
| 일정에 따라 진행 상황을 모니터링합니다.            | <p>여기에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 활동 및 이정표의 실제 완료를 주기적으로 측정</li> <li>• 활동의 실제 완료 및 마일스톤을 프로젝트 일정과 비교하여 중요한 편차를 식별합니다.</li> </ul>                                               |
| 지출된 노력과 비용을 모니터링합니다.              | <p>여기에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.</p>                                                                                                                                                                                       |

| 예시 활동 | 추가 설명                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 실제 노력과 지출된 비용을 주기적으로 측정</li> <li>• 실제 노력 및 비용을 계획/예산 예산 및 비용과 비교</li> <li>• 프로젝트 예산 및 추정치에서 중요한 편차 식별</li> </ul> |

#### 예시 작업 산출물

| 예시 작업 산출물     | 추가 설명                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 실제값 대 추정치의 기록 | 일반적으로 다음을 포함합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예산</li> <li>• 일정</li> <li>• 크기</li> <li>• 노력</li> <li>• 리소스</li> <li>• 지식 및 기술</li> </ul> |
| 현저한 편차에 대한 기록 |                                                                                                                                                     |
| 상태 검토 기록      |                                                                                                                                                     |
| 정정 조치         |                                                                                                                                                     |
| 비용 성과 보고서     | 작업 비용, 활동, 결과물 날짜, 순서 및 필요한 자원에 대한 계획된 결과와 실제 결과를 포함합니다.                                                                                            |
| 실적 보고서 예약     | 계획된 결과와 실제 결과를 작업, 활동, 결과물 날짜, 순서, 필요한 자원의 일정에 포함시킵니다.                                                                                              |

#### 상황에 따라 다릅니다

##### 서비스

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 컨텍스트 태그: | CMMI-SVC 시리즈                                   |
| 문맥:      | 프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다. |

용량 및 가용성을 모니터링하고 분석하면 서비스 중단 및 서비스 시스템 장애를 방지하기 위한 수정 조치의 필요성을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

각 구성 요소에 의한 각 자원의 사용을 포함하여 각 자원의 사용, 예를 들어, 주어진 자원에 대한 각 구성 요소에 의한 사용 범위 또는 정도를 기록한다. 장애의 영향을 분석하여 용량과 가용성을 조정합니다.

예기치 않은 수요 증가 시 리소스 사용을 모니터링하여 수정 조치가 필요한지 여부를 결정합니다. 수정 조치의 예는 다음과 같습니다.

- 제공되는 자원에 대한 조정

- 임계값 조정

- 서비스 자원의 정상적인 사용 및 서비스 시스템 성능에 대한 설명 조정

시정 조치의 필요성을 식별합니다.

- 용량 및 가용성 모니터링 및 분석을 기반으로 합니다.
- 서비스 인시던트, 변경 요청, 서비스 요구 사항 변경(현재 및 미래)에 대한 응답으로
- 서비스 시스템 성능을 개선하거나 서비스 계약 위반을 방지하기 위해

서비스 시스템을 모니터링하여 서비스 시스템 가용성에 영향을 주는 구성 요소의 오류를 감지하거나 방지합니다. 최소한 가용성을 모니터링합니다. 제공된 서비스, 개발 또는 인수 유형에 따라 적절한 경우 다른 품질 속성을 모니터링합니다. 많은 서비스 시스템의 경우 안정성 및 유지 관리성과 같은 다른 품질 특성을 모니터링하는 것도 적절할 수 있습니다. 서비스 구성 요소 오류에 대한 서비스 시스템의 복원력을 모니터링하고 특정 오류가 서비스 시스템 가용성에 미치는 영향을 식별합니다.

서비스 시스템의 용량 및 가용성을 모니터링하기 위한 활동에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 임계값에 대한 리소스 사용, 정상적인 사용에 대한 설명 및 서비스 시스템 성능 모니터링
- 자원 사용의 미래 변화(성장 또는 감소) 추정
  - 서비스 시스템 동작을 추정하기 위한 방법 및 도구에는 추세 분석, 분석 모델링, 시뮬레이션 모델링, 기준선 모델 및 응용 프로그램 크기 조정이 포함됩니다
  - 리소스 사용량 증가 추정치는 수집된 용량 및 가용성 데이터, 예상 요구 사항 및 서비스 시스템 표현을 기반으로 할 수 있습니다
- 성능 목표에 대한 결과 분석과 용량 및 가용성에 미치는 영향 전달
  - 용량 및 가용성 보고서는 정기적이거나 임시로 작성될 수 있습니다. 도움이 되는 경우 자동화된 보고 기능이 있는 데이터베이스를 사용하여 보고를 간소화합니다. 조직 보고 표준을 따릅니다. 표준 도구와 기술이 있는 경우 표준 도구와 기술을 사용하여 보고서의 정보를 통합하고 통합합니다.
  - 정보는 청중에게 적절하고 이해할 수 있어야 하며 다양한 관점을 다루어야 할 수 있습니다. 이러한 관점에는 비즈니스, 최종 사용자, 고객 또는 공급자가 포함될 수 있습니다. 계약은 보고된 정보, 전달되어야 하는 대상, 제공 방법(예: 형식, 세부 정보, 배포, 미디어)을 정의할 수 있습니다.
  - 가용성은 일반적으로 백분율로 보고됩니다. 필요한 경우 가용성을 보고하는 것 외에도 안정성(예: 서비스 또는 서비스 시스템 구성 요소의 신뢰성, 유지 관리성 및 기타 품질 속성)에 대해 보고합니다.

#### 공급 업체

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 컨텍스트 태그: | CMMI-SPM                                   |
| 문맥:      | 프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다. |

지출로 이어지는 리소스 약정(예: 조직에 비용이 발생할 때 발행된 구매 주문서 및 완료된 수락된 공급업체 결과물)을 추적합니다. 재정적 및 법적 의무를 설명하기 위해 공식적인 지불 전에도 자원 약정을 추적합니다. 지출로 이어지지 않는 약속(예: 자원 또는 기술 할당)을 모니터링합니다.

공급업체 결과물의 예는 다음과 같습니다.

- 공급업체 진행 상황 및 성과 보고서
- 계획 또는 프로세스에서 크게 벗어난 기록
- 비용 성과 보고서

## 앤씨 2.2

### 필수 실습 정보

#### 실천 선언문

식별된 이해 관계자 및 약속의 참여를 추적합니다.

#### 값

성공적인 작업 완료에 중요한 이해 관계자의 참여를 관리합니다.

#### 추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

### 설명 실습 정보

#### 추가 설명 정보

계획과 프로세스에 따라 이해 관계자의 참여를 관리합니다. 요구 사항, 상황 또는 상태가 변경될 때 이해 관계자의 참여를 다시 계획합니다.

#### 예시 활동

| 예시 활동                              | 추가 설명                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 이해 관계자의 참여 상태를 정기적으로 검토하고 기록합니다.   | 이해 관계자의 참여는 팀 회의 및 부서 간 조정 회의와 같은 이벤트에서 추적할 수 있습니다. |
| 중요한 이해 관계자 문제를 식별하고 기록합니다.         |                                                     |
| 권장 사항을 개발하고 문제를 해결하기 위한 조치를 조정합니다. |                                                     |

## 예시 작업 산출물

| 예시 작업 산출물             | 추가 설명                         |
|-----------------------|-------------------------------|
| 이해관계자 참여 기록           | 참석자 목록과 함께 회의 기록 및 검토가 포함됩니다. |
| 협업 활동을 위한 의제 및 일정     |                               |
| 관련자 문제를 해결하기 위한 권장 사항 | 결정 기록을 포함합니다.                 |
| 기록된 문제                | 해결된 문제와 해결되지 않은 문제를 모두 식별합니다. |

## 관련 실무 영역 추정

## (EST) 계획 (PLAN)

## 상황에 따라 다릅니다

## 서비스

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 컨텍스트 태그: | CMMI-SVC 시리즈                                   |
| 문맥:      | 프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다. |

이해 관계자의 참여를 모니터링하고 추적하려면 이해 관계자에게 중요한 정보를 전달하는 것이 포함됩니다. 용량 및 가용성 관리에 대한 데이터 결과를 전달하면 성능 목표를 달성하는 데 집중할 수 있습니다.

이해 관계자 커뮤니케이션 활동 및 주제의 예는 다음과 같습니다.

- 자원의 성능 및 사용 보고
- 서비스 시스템의 예외 조건 및 요구 사항 위반 보고
- 자원 사용의 성장 추정치에 대한 모니터링의 데이터 보고
- 다음을 포함한 리소스의 용량, 가용성, 안정성 및 유지 관리 가능성 보고:
  - 성능 보고서
  - 리소스 사용 보고서
  - 리소스 사용 예측Resource use projections
  - 가용성 보고서

## 예시 2.3

## 필수 실습 정보

## 실천 선언문

운영 및 지원으로의 전환을 모니터링합니다.

## 값

원활한 솔루션 전환과 성공적인 구현을 통해 예상되는 이점을 얻을 수 있습니다.

## 추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

## 설명 실습 정보

### 추가 설명 정보

운영 및 지원으로의 전환 계획에 대해 수락된 솔루션의 실제 전환을 모니터링하고 제어합니다. 경우에 따라 솔루션을 고객에게 직접 제공하여 이를 수행할 수 있습니다.

### 예시 활동

| 예시 활동                                                        | 추가 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 운영 및 지원 기능을 모니터링하여 신규 또는 수정된 솔루션을 수신, 저장, 사용 및 최신 상태로 유지합니다. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 운영 및 지원 조직은 솔루션을 수용하고 중단 없는 지원을 제공할 준비가 되어 있음을 입증해야 합니다</li> <li>• 전환 준비 기준과 확인 및 검증 방법을 사용하여 제공된 솔루션이 지정된 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.</li> <li>• 확인 및 검증 방법을 사용하여 운영 및 지원에 대한 수용 준비 상태를 확인합니다.</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| 솔루션의 수신, 저장, 사용 및 업데이트와 관련된 이해 관계자에 대한 교육 제공을 모니터링합니다.       | <p>여기에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관련된 이해 관계자에 특정한 올바른 교육 자료 및 리소스가 사용 가능하고 사용되는지 확인합니다.</li> <li>• 적절한 교육이 적시에 적절한 사람에게 제공되는지 확인</li> <li>• 제공된 교육을 통해 수혜자가 작업을 효율적이고 효과적으로 수행할 수 있는지 확인</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| 전환 활동의 결과를 검토하고 분석합니다.                                       | <p>운영 및 지원에 책임을 이전하기 전에 지정 조치를 완료해야 하는지 여부를 결정합니다.</p> <p>전이 해석을 지원하는 작업 산출물의 예는 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 파일럿 및 보증 기간 동안 수집된 품질 조치를 포함하는 전환 활동 보고서</li> <li>• 문제 추적 보고서, 해결 시간, 에스컬레이션 및 원인 분석을 자세히 설명합니다.</li> <li>• 변경 관리 보고서</li> <li>• 구성 관리 레코드</li> <li>• 수정 버전을 지원하기에 충분한 정보가 저장되었는지 확인하기 위한 작업 로그</li> <li>• 보안 보고서</li> <li>• 추정치와 비교한 실제 운영 및 지원 비용</li> </ul> |

## 예시 작업 산출물

| 예시 작업 산출물     | 추가 설명                                            |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 전환 활동의 상태 보고서 | 위험, 문제 또는 취한 시정 조치를 포함한 전환 활동의 현재 상태.            |
| 전환 준비 상태 보고서  | 계획에 따라 수행되도록 하기 위해 전환하기 전에 솔루션의 준비 상태에 대한 설명입니다. |
| 전환 지원 검토 기록   | 시정 조치가 포함될 수 있습니다.                               |
| 학습한 교훈 보고서    |                                                  |

## 상황에 따라 다릅니다

## 공급 업체

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 컨텍스트 태그: | CMMI-SPM                                   |
| 문맥:      | 프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다. |

일반적으로 공급업체는 솔루션을 통합 및 패키징하고 비즈니스 사용자 수용 지원을 포함하여 운영 및 지원으로의 전환을 준비하는 역할을 합니다. 인수자는 이러한 공급업체 활동을 모니터링합니다. 공급업체 요청 패키지 및 공급업체 계약은 공급업체의 기대치와 운영 및 지원으로 전환하기 위한 수락 기준을 설정합니다.

공급업체 결과물의 예는 다음과 같습니다.

- 교육 자료 및 지원 작업 제품
- 사이트 준비 상태 보고서
- 검증 보고서
- 훈련 기록
- 운영 준비 상태 보고서
- 테스트 결과
- 파일럿 결과

인수자는 공급업체 계약 또는 사내 운영 및 지원 조직을 통해 인수한 솔루션을 운영할 수 있는 적절한 준비를 합니다. 일반적으로 공급업체는 솔루션에 대한 교육을 개발합니다.

## 앰씨 2.4

## 필수 실습 정보

## 실천 선언문

실제 결과가 계획된 결과와 크게 다를 경우 시정 조치를 취하고 종료할 수 있습니다.

## 값

목표가 달성될 확률을 높이기 위해 시정 조치를 관리합니다.

## 추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

## 설명 실습 정보

### 추가 설명 정보

문제를 수집 및 분석하고 문제를 해결하기 위한 수정 조치를 결정합니다. 종결에 대한 정정 조치를 관리합니다. 작업은 자동화하거나, 수동으로 수행하거나, 이 둘을 조합할 수 있습니다. 시정 조치의 예는 다음과 같습니다.

- 성능 문제를 방지하거나 성능을 개선하기 위한 리소스 조정
- 리소스 간 작업 부하 재조정 **Rebalancing workload between resources**
- 생산성을 높일 수 있도록 프로세스를 개선하여 효율성 및 효과를 높입니다.
- 생산성, 효율성 또는 효과를 높이기 위해 새로운 기술을 사용하는 것과 같은 설계 개선
- 용량 해결 및 가용성 추가(예: 사람 또는 기타 리소스 추가)
- 용량 또는 성능을 최적화하고 개선하기 위한 튜닝
- 요구 사항 조정
- 수요 관리 기법을 통한 자원 사용 개선

## 예시 활동

| 예시 활동                           | 추가 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 분석을 위해 문제를 수집합니다.               | <p>검토 및 다른 프로세스의 실행에서 문제를 수집합니다.</p> <p>수집해야 하는 문제의 예는 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기술 검토, 확인 및 검증을 수행할 때 발견된 문제</li> <li>• 프로젝트 계획의 추정치와 프로젝트 계획 매개변수의 상당한 편차</li> <li>• 충족되지 않은 약속(내부 또는 외부)</li> <li>• 위험 상태의 현저한 변화</li> <li>• 데이터 액세스, 수집, 개인 정보 보호 또는 보안 문제</li> <li>• 이해관계자 대표 또는 참여 문제</li> <li>• 달성되지 않은 솔루션, 도구 또는 환경 전환 가정(또는 기타 고객 또는 공급업체 약속)</li> </ul> |
| 문제를 분석하여 수정 작업이 필요한지 여부를 결정합니다. | 문제를 해결하지 않고 방치할 경우 프로젝트가 목표를 달성하지 못할 수 있는 경우 수정 조치가 필요합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 예시 활동                   | 추가 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 식별된 문제에 대해 수정 조치를 취합니다. | <p>단계에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 선택한 문제를 해결하기 위한 작업을 결정하고 기록합니다. 잠재적인 조치의 예는 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 작업 명세서(SOW) 수정</li> <li>○ 요구 사항 수정</li> <li>○ 견적 및 계획 수정</li> <li>○ 약속 재협상</li> <li>○ 리소스 추가</li> <li>○ 프로세스 변경</li> <li>○ 기술 및 효율성 향상</li> <li>○ 프로젝트 리스크 수정</li> </ul> </li> <li>• 조치에 대해 영향을 받는 이해 관계자의 동의를 얻습니다.</li> <li>• 조직의 정의 및 설정된 사용 충돌 및 분쟁을 해결하는 방법</li> <li>• 내부 및 외부 약속에 대한 변경 협상</li> </ul> |
| 종결에 대한 수정 작업을 관리합니다.    | <p>여기에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 완료까지 수정 작업 추적</li> <li>• 시정 조치의 결과를 분석하여 효과를 판단하고 추가 시정 조치가 필요한지 여부 확인</li> <li>• 취해진 초기 시정 조치가 효과적이지 않은 경우 중요한 편차의 최종 해결 기록을 기록합니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 예시 작업 산출물

| 예시 작업 산출물        | 추가 설명                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수정 조치가 필요한 문제 목록 | <p>다음에 포함합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문제 또는 작업 항목의 상태</li> <li>• 작업 항목에 대한 책임자</li> <li>• 시정 조치 계획</li> <li>• 시정 조치 결과</li> </ul> |

## 관련 업무 영역

계획 수립 (PLAN)

확인 및 검증(VV)

## 상황에 따라 다릅니다

### 서비스

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>컨텍스트 태그:</b> | CMMI-SVC 시리즈                                   |
| <b>문맥:</b>      | 프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다. |

작업 그룹 수준 모니터링 및 제어 또는 측정 및 분석은 서비스 시스템 운영에 대한 일부 모니터링을 적절하게 다룰 수 있습니다. 여기에는 다음과 같은 서비스 제공과 관련된 다른 운영 지향적 품질 특성의 관리 및 제어가 포함될 수 있습니다.

- 용량
- 가용도
- 응답성
- 서비스 수준 계약 성능
- 사용성
- 신뢰도
- 유지 관리
- 안전
- 안전

- 보안 위반 모니터링, 취약성 수정 및 서비스에 대한 액세스 제어
- 서비스 제공업체가 서비스 계약에 명시된 대로 승인된 서비스만 승인된 직원에게만 제공하도록 합니다.

그러나 일부 서비스는 개별 서비스 요청 수준에서 또는 단일 서비스 요청 범위 내에서 지속적으로 모니터링 및 데이터 수집이 필요할 수 있습니다. 이러한 모니터링에는 데이터 수집, 분석 및 보고를 적절하게 처리할 수 있는 자체 도구가 필요할 수 있습니다. 이러한 도구는 자동화되는 경우가 많습니다. 모니터링 및 데이터 수집 도구를 적절하게 사용하여 서비스 시스템 구성 요소에 대한 낮은 수준의 모니터링을 수행합니다.

### 공급 업체

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>컨텍스트 태그:</b> | CMMI-SPM                                   |
| <b>문맥:</b>      | 프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다. |

인수자는 인수자 또는 공급업체 구현 결과가 계획에서 벗어날 때 시정 조치를 취할 전적인 책임이 있습니다.

인수자는 예를 들어 측정 데이터를 모니터링하여 공급업체의 진행 상황이 공급업체 계약에 정의된 서비스 수준을 충족하기에 충분한지 여부를 결정합니다. 공급업체의 진행 상황이 충분하지 않은 경우 인수자는 공급업체와 함께 시정 조치를 시작하고 관리합니다. 공급업체가 이 시정 조치를 적절하게 준수하지 않는 경우 인수자는 해결을 위해 문제를 에스컬레이션합니다.

## 레벨 3

### 앰씨 3.1

#### 필수 실습 정보

##### 실천 선언문

프로젝트 계획 및 프로젝트 프로세스를 사용하여 프로젝트를 관리합니다.

##### 값

필요한 활동이 수행되도록 하여 재작업을 줄이고 목표 달성 가능성을 높입니다.

#### 추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

#### 설명 실습 정보

##### 추가 설명 정보

프로젝트를 관리하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 각 활동에 얼마나 많은 시간이 소요되는지 이해하고 시간을 가장 효과적으로 사용하는지 결정합니다.
- 프로젝트에 사용되고 사용 가능한 리소스 측정
- 팀 구성원 및 관련자에게 상태 제공

#### 예시 활동

| 예시 활동                                      | 추가 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트 프로세스 및 모든 관련 계획을 사용하여 프로젝트 활동을 관리합니다. | <p>프로젝트 프로세스는 프로젝트의 프로젝트에 의해 조정됩니다. 조직의 표준 프로세스 집합입니다.</p> <p>여기에는 다음이 포함됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정의된 시작 및 종료 기준을 사용하여 작업 시작 및 완료</li> <li>• 계획 매개변수의 실제 값(예: 크기, 남은 작업량, 소비된 작업량 및 복잡성의 변화)에 큰 영향을 미칠 수 있는 활동 모니터링</li> <li>• 측정 가능한 임계값을 사용하여 계획 매개변수를 추적하여 조사 및 시정 조치를 트리거합니다.</li> <li>• 위험 모니터링</li> <li>• 작업 및 작업 산출물에 대한 계획을 기반으로 외부 및 내부 약속을 관리합니다.</li> <li>• 다음 간의 관계를 이해합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 프로젝트 프로세스의 작업 및 작업 산출물, 그리고</li> </ul> </li> </ul> |

| 예시 활동                                                      | 추가 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영향을 받는 이해 관계자의 역할</li> <li>● 품질 관리 프로세스(예: 동료 평가, 객관적 평가)를 사용하여 성과에 대한 가시성과 작업 통제를 모두 개선합니다.</li> <li>● 진행 상황이 계획에서 크게 벗어난 경우 시정 조치를 취합니다.</li> </ul>                                                                                       |
| 선택한 측정값을 수집 및 분석하여 프로젝트를 관리하고 조직의 요구 사항을 지원합니다.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 프로젝트 성과를 정기적으로 검토하고 조직, 고객 및 최종 사용자의 요구 사항 및 목표에 맞게 조정합니다. | <p>정렬을 달성하는 작업의 예는 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 계획 매개 변수, 프로젝트 및 위험의 변경에 대응하여 일정 업데이트</li> <li>● 시장 기회 또는 고객 및 최종 사용자 요구 사항의 변화에 대응하여 요구 사항 또는 약속을 업데이트합니다.</li> <li>● 프로젝트, 반복 또는 릴리스 종료</li> </ul>                                                       |
| 프로젝트 목표에 영향을 미치는 문제의 원인을 해결합니다.                            | <p>여기에는 다음이 포함됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 이전 작업에서 배운 문제 및 교훈 검토</li> <li>● 선택한 문제에 대한 인과 분석을 수행하여 시정 조치가 필요한 부분을 식별합니다.</li> <li>● 재발 방지에 필요한 프로세스 변경 사항 평가</li> <li>● 시정 조치 수행 및 프로세스 변경 구현</li> <li>● 시정 조치 및 프로세스 변경으로 문제 재발을 방지하고 성능을 향상시켰는지 확인</li> </ul> |

#### 예시 작업 산출물

| 예시 작업 산출물             | 추가 설명 |
|-----------------------|-------|
| 모니터링 결과               |       |
| 수집된 측정 및 상태 기록 또는 보고서 |       |

#### 관련 업무 영역

인과 관계 분석 및 해결(CAR)

성능 및 측정 관리(MPM)

상황에 따라 다릅니다

서비스

|          |              |
|----------|--------------|
| 컨텍스트 태그: | CMMI-SVC 시리즈 |
|----------|--------------|

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| <b>문맥:</b> | 프로세스를 사용하여 고객 요구 사항을 충족하는 서비스를 제공, 관리 및 개선합니다. |
|------------|------------------------------------------------|

프로젝트를 관리할 때는 다음과 같은 서비스 제공 및 서비스 성능의 중요한 종속성을 고려해야 합니다.

- 선적 시기
- 서비스 제공 활동
- 서비스 제공 일정
- 운영 절차
- 서비스 계약에서 식별된 서비스 요청
- 서비스 제공 성능 및 측정
- 서비스 제공을 위한 시설의 위치

#### 공급 업체

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 컨텍스트 태그: | CMMI-SPM                                   |
| 문맥:      | 프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다. |

공급업체 결과물의 예는 다음과 같습니다.

- 프로젝트 진행 상태 및 성과 보고서
- 측정
- 위험 요소 로그
- 문제 로그
- 의사결정 로그

## 앰씨 3.2

### 필수 실습 정보

#### 실천 선언문

중요한 종속성 및 활동을 관리합니다.

#### 값

중요한 종속성을 관리하여 위험을 크게 줄이고 목표 달성 가능성을 높입니다.

#### 추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

### 설명 실습 정보

#### 추가 설명 정보

중요한 종속성에는 리소스의 정시 가용성도 포함될 수 있습니다.

## 예시 활동

| 예시 활동                | 추가 설명                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 종속성을 검토하고 업데이트합니다.   | 다음에 대한 계약 기록:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 종속 업무 조정</li> <li>• 리소스를 적시에 사용할 수 있도록 보장</li> </ul> 종속성을 충족할 수 없는 경우 영향을 받는 모든 이해 관계자에게 사전 커뮤니케이션을 제공합니다. |
| 검토 및 토론의 의사록을 기록합니다. |                                                                                                                                                                      |
| 문제를 기록합니다.           |                                                                                                                                                                      |

## 예시 작업 산출물

| 예시 작업 산출물      | 추가 설명                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 중요한 종속성이 업데이트됨 |                                                                                                                                                                 |
| 기록된 의제 및 회의록   | 종속성은 일반적으로 다음에서 관리되고 조정됩니다.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 상태 검토</li> <li>• 경영진 검토</li> <li>• 영향을 받는 이해 관계자 토론</li> <li>• 부서 간 팀 조정 이벤트</li> </ul> |
| 기록된 문제         | 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 공급업체 지연</li> <li>• 이해 관계자의 참여(또는 참여 부족)</li> <li>• 문제 해결을 위한 권장 사항</li> </ul>                  |

## 상황에 따라 다릅니다

## 공급 업체

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>컨텍스트 태그:</b> | CMMI-SPM                                   |
| <b>문맥:</b>      | 프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다. |

공급업체 계약은 프로젝트에 대한 공급업체 참여를 관리하기 위한 기초를 제공합니다. 인수자가 이해 관계자 조직과 체결하는 기관 간 및 회사 간 계약, 양해 각서, 합의 각서와 같은 공급업체 계약은 이해 관계자 조직 참여의 기초를 제공합니다. 이러한 이해 관계자 조직은 솔루션 공급자 또는 수신자가 될 수 있습니다. 이러한 계약은 인수자의 프로젝트가 복잡한 통합 솔루션을 생산할 때 특히 중요합니다.

## 앰씨 3.3

### 필수 실습 정보

#### 실천 선언문

작업 환경을 모니터링하여 문제를 식별합니다.

#### 값

효과적이고 안전하며 건강한 작업 환경을 제공하여 목표가 달성되도록 합니다.

#### 추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

### 설명 실습 정보

#### 추가 설명 정보

인력의 안전, 건강, 효율성 및 생산성을 저하시키는 환경 및 물리적 요인을 식별하고 수정합니다.

환경을 모니터링하여 사람들이 목표 달성에 집중할 수 있고 문제와 원치 않는 방해 요소가 없는지 확인합니다. 전체 직원이 근로자의 안전과 건강이 목표 달성의 핵심임을 인식하도록 합니다.

#### 예시 활동

| 예시 활동                                                             | 추가 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 안전, 건강, 효과 및 생산성에 영향을 미치는 작업 환경 요소를 모니터링하고 필요한 수정 사항을 식별하고 기록합니다. | <p>작업 환경 요소에는 다음이 포함될 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>표준 워크스테이션 하드웨어 및 소프트웨어</li> <li>표준 생산 및 교정 장비</li> <li>건물, 시설 및 기타 물리적 자원</li> <li>안전</li> <li>안전</li> <li>경영진 및 리더십</li> <li>특정 환경 조건</li> <li>작업 환경에 대한 정기 검사</li> <li>건강과 복지</li> <li>다양성</li> <li>사생활</li> </ul> |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>작업 환경에서 성능을 저하시킬 수 있는 물리적 요인을 모니터링하고 필요한 수정 사항을 식별하고 기록합니다.</p> | <p>성능을 저하시킬 수 있는 물리적 요인의 예는 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 부적절한 사무실 또는 회의 공간</li> <li>• 조명이 좋지 않음</li> <li>• 부적절한 가열, 환기 또는 냉방</li> <li>• 불쾌한 냄새나 연기</li> <li>• 진동</li> <li>• 과도한 소음</li> <li>• 밀집 또는 고립</li> <li>• 환경 위험 요소</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 예시 활동                                     | 추가 설명                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 잠재적인 작업 환경 문제와 필요한 수정 사항을 식별, 기록 및 보고합니다. | <p>잠재적인 작업 환경 문제 문제의 예는 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 필요한 안전 표준을 적용하지 않음</li> <li>● 부적절한 보안</li> <li>● 부적절한 인체 공학</li> <li>● 건강에 해로운 물질에 대한 노출</li> <li>● 열악한 공기 또는 수질</li> <li>● 과도한 스트레스</li> </ul>                                            |
| 수정하는 동안 작업 환경 문제를 수용하기 위해 합리적인 조치를 취하십시오. |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 성능을 저하시키는 방해 요소나 방해 요소를 제거하거나 줄입니다.       | <p>방해 또는 산만함의 예는 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 잦은 전화 통화</li> <li>● 과도한 회의</li> <li>● 과도한 관리 작업</li> <li>● 다른 사람이 더 잘 수행할 수 있는 작업</li> <li>● 소셜 미디어, 문자 메시지 등을 포함한 과도한 사교 활동.</li> </ul>                                                          |
| 성능을 저하시키는 물리적 요인을 제거하거나 줄입니다.             | <p>물리적 작업 환경 요인의 영향을 줄일 수 있는 것의 예는 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 부적절한 온도 제어를 수정하기 위해 문제의 영향을 줄이는 자원(예: 팬 또는 히터) 제공</li> <li>● 재택 근무 또는 계획된 추가 사무실 공간과 같이 문제를 제거할 의도를 전달합니다.</li> </ul> <p>사람들이 자신과 관련된 문제의 영향을 줄이는 합리적인 조정을 할 수 있도록 합니다.</p>     |
| 작업 환경 문제 해결의 진행 상황을 모니터링합니다.              | <p>초기 수정 후 결과를 분석하고 작업 환경 문제에 대한 추가 수정이 필요한지 여부를 결정합니다.</p> <p>물리적 요인의 영향을 효과적으로 제거할 수 없는 경우 대체 완화 전략 및 솔루션을 추구합니다.</p> <p>물리적 요인에 대한 초기 수정으로 문제가 해결되지 않은 경우 검토하고 잠재적인 원인과 이를 해결하기 위한 대체 솔루션을 식별합니다.</p>                                                                  |
| 업무 관계를 악화시키는 대인 관계 문제를 해결합니다.             | <p>대인 관계 문제를 해결하는 방법의 예는 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 멘토링 또는 공식 교육을 통한 대인 관계 의사 소통 기술 향상</li> <li>● 한 명 이상의 개인에게 조언 또는 상담</li> <li>● 옴부즈맨, 중재인 또는 진행자 사용</li> <li>● 하나 이상의 개인 재할당</li> <li>● 징계 조치 취하기</li> <li>● 동의하지 않는 것에 동의하는 경우</li> </ul> |

## 예시 작업 산출물

| 예시 작업 산출물       | 추가 설명 |
|-----------------|-------|
| 작업 환경에 대한 수정 필요 |       |

## 예시 3.4

## 필수 실습 정보

## 실천 선언문

영향을 받는 이해 관계자와 함께 문제를 관리하고 해결합니다.

## 값

문제를 조기에 해결하여 목표를 달성할 가능성을 높입니다.

## 추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

## 설명 실습 정보

## 추가 설명 정보

영향을 받는 이해 관계자와 문제를 식별, 전달 및 해결합니다. 프로세스 초기에 알림을 받고 참여하면 이해 관계자는 자신의 책임을 보다 효과적으로 처리하여 목표 및 계획과 조화를 이룰 수 있습니다.

문제의 예는 다음과 같습니다.

- 불완전한 요구 사항
- 설계 결함
- Late critical dependencies and commitments(늦은 중요 종속성 및 약속)
- 솔루션 문제
- 사용할 수 없는 중요한 리소스

## 예시 활동

| 예시 활동                                   | 추가 설명                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 문제를 식별하고 기록합니다.                         | 문제는 일반적으로 회의 및 부서 간 조정 이벤트에서 식별됩니다. |
| 영향을 받는 이해 관계자에게 문제를 전달합니다.              |                                     |
| 영향을 받는 이해 관계자와 관련된 문제를 해결합니다.           |                                     |
| 영향을 받는 이해 관계자와 함께 해결할 수 없는 문제를 담당 관리자에게 |                                     |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 에스컬레이션합니다.      |  |
| 종결까지 문제를 추적합니다. |  |

| 예시 활동                                 | 추가 설명 |
|---------------------------------------|-------|
| 영향을 받는 이해 관계자와 문제의 상태 및 해결 방법을 전달합니다. |       |

#### 예시 작업 산출물

| 예시 작업 산출물 | 추가 설명                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기록된 문제    | <p>다음에 포함합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 발행 성명</li> <li>● 책임자</li> <li>● 마감일</li> <li>● 해상도</li> <li>● 상태</li> </ul> |

#### 상황에 따라 다릅니다

#### 공급 업체

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 컨텍스트 태그: | CMMI-SPM                                   |
| 문맥:      | 프로세스를 사용하여 공급업체와 공급업체의 계약을 식별, 선택 및 관리합니다. |

모니터링은 복잡한 환경에서 특히 중요합니다. 다른 시스템의 소유자, 인수자 및 고객의 참여는 복잡한 통합 솔루션의 성공에 매우 중요합니다.

모니터링은 공급업체가 솔루션 개발 활동에서 애자일 방법론을 사용하는 환경에서도 중요합니다. 이러한 환경에서는 최종 사용자 또는 해당 프록시의 지속적인 참여가 제공되는 전체 기능의 하나 이상의 요소를 개발하고 검증하는 데 중요할 수 있습니다.
